Sommaire

1. Résumé exécutif 1

2. Périmètre, référentiels et démarche 2

3. Feuille de route : vue d'ensemble 3

4. Phase 0 — Cadrage et financement 4

5. Phase 1 — Conception produit et UX 6

6. Phase 2 — Conception technique et architecture 7

7. Phase 3 — Conformité réglementaire et partenariats 8

8. Phase 4 — Développement du MVP 9

9. Phase 5 — Qualité, sécurité et tests 11

10. Phase 6 — Pilote terrain et itérations 12

11. Phase 7 — Lancement commercial 13

12. Phase 8 — Industrialisation et évolutions 14

13. Équipe, gouvernance, budget et risques 15

1. Résumé exécutif

Unirances (anciennement MboaAssur) est une plateforme d'assurance digitale conçue pour le marché camerounais et la zone CIMA, qui regroupe la comparaison des offres, la souscription en ligne avec paiement Mobile Money, la délivrance d'attestations numériques certifiées par QR code et la déclaration simplifiée de sinistres. Le projet dispose déjà de deux actifs majeurs : un ensemble de dossiers de conception fonctionnelle et technologique d'environ 515 pages couvrant plus de 120 écrans, et un business plan chiffré aux sources officielles (ASAC, FANAF, CIMA) qui établit la viabilité économique du modèle sur 2027-2029. Le présent document fait la synthèse opérationnelle des deux : il organise la transformation de la conception en produit commercial à travers un plan d'exécution en neuf phases, jalonné de points de décision GO/NO-GO, étalé de novembre 2026 à décembre 2028.

9 phases de cadrage à l'industrialisation, jalonnées GO / NO-GO	**26 mois** novembre 2026 à décembre 2028	**50 M FCFA** budget de développement aligné sur le business plan	**T3 2027** lancement commercial (trajectoire BP : 20 M FCFA en an 1)

La démarche retenue est hybride : la conception produit et technique suit une logique séquentielle de cycle en V, tandis que le développement s'exécute en sprints agiles de deux semaines avec démonstration systématique. La conformité réglementaire — agrément d'intermédiaire auprès de l'ASAC, garantie financière prévue par l'article 530 du Code CIMA, conventions d'apport avec les compagnies — est traitée comme le chemin critique du projet et démarre dès la septième semaine, en parallèle de la conception. Le budget total de 50 millions de FCFA identifié par le business plan est réparti par phase et par poste, avec une réserve de 12 % pour les imprévus. Chaque phase se conclut par des critères de sortie explicites : un jalon ne franchit le seuil GO que si ces critères sont remplis, ce qui protège le financement et évite l'engagement de coûts sur des bases fragiles.

Le document se lit de deux manières. Le chapitre 3 donne la vue d'ensemble du calendrier avec le diagramme de Gantt et la table de synthèse des neuf phases. Les chapitres 4 à 12 détaillent ensuite chaque phase selon une structure identique — objectifs, activités clés, livrables, jalon et critères de sortie — de sorte que chaque responsable peut extraire directement sa feuille de route. Le chapitre 13 regroupe enfin les moyens transverses : équipe et effectifs, budget détaillé, gouvernance de pilotage et registre des risques avec leurs mesures d'atténuation.

2. Périmètre, référentiels et démarche

Le plan couvre l'intégralité du cycle de mise en oeuvre du projet : cadrage stratégique, conception produit et technique, mise en conformité réglementaire, développement du produit minimum viable (MVP), qualification qualité et sécurité, pilote terrain, lancement commercial et industrialisation. Il ne revient ni sur le diagnostic de marché ni sur les projections financières, qui sont traités dans le business plan 2027-2029 auquel il se réfère en permanence. Son périmètre de décision s'arrête à la fin de l'année 2028, point où le business plan attend un chiffre d'affaires de l'ordre de 86,5 millions de FCFA et un résultat net positif confirmé.

2.1 Les fondations documentaires du projet

Le plan s'appuie sur les documents déjà produits par le projet, dont il consolide et hiérarchise les enseignements. Cette table établit la traçabilité entre les référentiels existants et leur usage dans le plan d'exécution :

Référentiel	Contenu	Apport au plan d'exécution
Étude fonctionnelle et dossiers 4 à 6	Parcours détaillés : devis, souscription et attestation digitale, contrats, profil et notifications, sinistres	Périmètre fonctionnel du MVP et spécifications des écrans (chapitres 5 et 8)
Dossier de conception final (312 p.)	Vision produit, règles métier, architecture fonctionnelle, feuille de route initiale	Règles métier priorisées, harmonisation des parcours, base du design system
Business plan 2027-2029	Marché chiffré ASAC/FANAF/CIMA, modèle de commissions d'apport, projections, besoin de 50 M FCFA	Cadre financier, cibles commerciales et indicateurs de succès (chapitres 11 à 13)
Cadre réglementaire CIMA / ASAC	Code CIMA (art. 506, 508, 530), régime des intermédiaires, garantie financière	Feuille de route de conformité et partenariats (chapitre 7)

Table 1 — Les référentiels du projet et leur usage dans le plan.

2.2 Une démarche hybride : séquentielle pour concevoir, agile pour construire

La conception ne s'improvise pas en mode agile : les parcours de souscription et de sinistre touchent des obligations réglementaires et des règles métier qui exigent une spécification stable avant développement. Le plan adopte donc une démarche en deux régimes. Les phases 0 à 2 avancent en logique séquentielle avec des livrables de conception validés formellement. À partir de la phase 4, le projet bascule en sprints de deux semaines, chaque sprint livrant un incrément démontrable de la plateforme. Entre les deux régimes, quatre jalons GO/NO-GO structurent la prise de décision :

Jalon	Moment	Décision engagée	Conditions minimales
J0 — GO conception	décembre 2026	Lancement des phases 1 et 2 (produit et technique)	Financement noyau bouclé, MVP priorisé, équipe de conception en place
J1 — GO développement	février 2027	Engagement des sprints de développement du MVP	Maquettes validées, architecture choisie, POC Mobile Money concluant
J2 — GO pilote	juin 2027	Ouverture de la bêta privée auprès des utilisateurs pilotes	MVP complet, tests critiques au vert, au moins une convention d'apport
J3 — GO lancement	septembre 2027	Ouverture commerciale grand public	KPI du pilote atteints, agrément effectif, deux compagnies partenaires

Table 2 — Les quatre jalons GO/NO-GO du plan.

Un NO-GO n'est jamais un abandon : il déclenche un plan de reprise ciblé sur les critères manquants, avec une réévaluation à date fixe. Ce mécanisme est le principal garde-fou financier du projet, car il plafonne l'exposition de chaque étape au montant de sa phase et empêche l'effet d'engrenage des dépenses.

3. Feuille de route : vue d'ensemble

Le plan d'exécution s'étale sur vingt-six mois, de novembre 2026 à décembre 2028, et se décompose en neuf phases dont cinq sont partiellement parallèles. Le diagramme ci-dessous matérialise cet enchaînement : les phases de conception (P0 à P2) s'ouvrent dès la fin 2026, la construction (P3 à P5) occupe le premier semestre 2027, puis le lancement et la montée en charge (P6 à P8) conduisent la plateforme jusqu'à son régime de croisière fin 2028. Les losanges noirs marquent les quatre jalons de décision décrits au chapitre précédent.

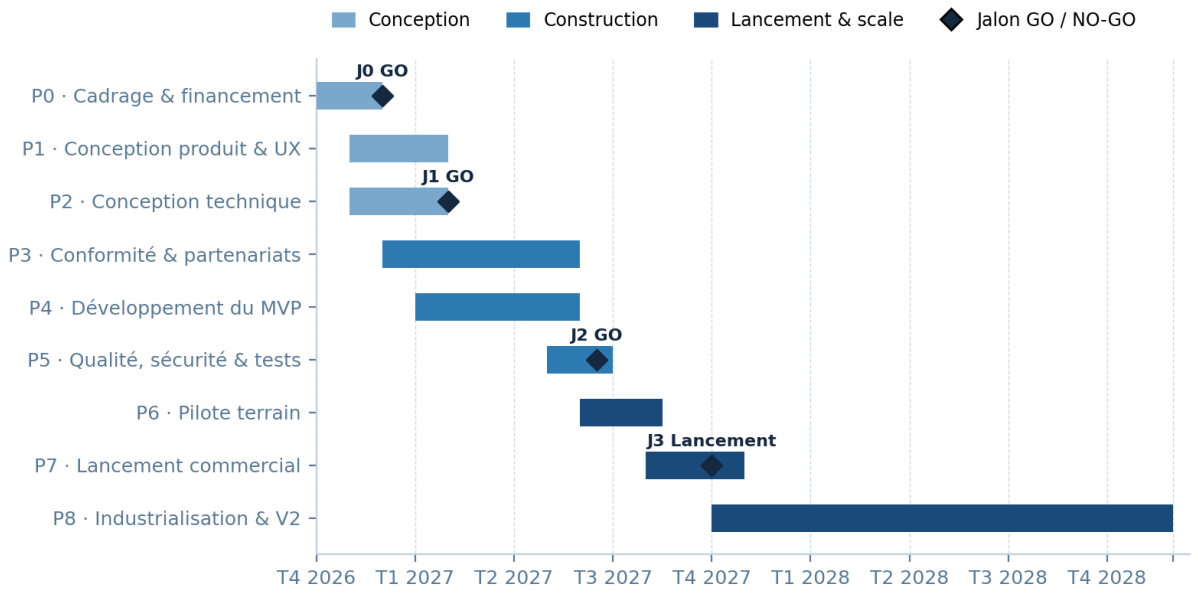


Figure 1 — Feuille de route des neuf phases (novembre 2026 à décembre 2028).

Phase	Période	Durée	Jalon de sortie
P0 · Cadrage et financement	nov. - déc. 2026	4 semaines	J0 — GO conception
P1 · Conception produit et UX	déc. 2026 - févr. 2027	6 semaines	Maquettes validées
P2 · Conception technique	déc. 2026 - févr. 2027	8 semaines	J1 — GO développement
P3 · Conformité et partenariats	janv. - juin 2027	20 semaines	Agrément + 2 conventions
P4 · Développement du MVP	févr. - juin 2027	16 semaines (8 sprints)	MVP complet
P5 · Qualité, sécurité et tests	juin - juil. 2027	4 semaines	J2 — GO pilote
P6 · Pilote terrain	juil. - sept. 2027	6 semaines	KPI pilote atteints
P7 · Lancement commercial	sept. - nov. 2027	8 semaines	J3 — GO lancement
P8 · Industrialisation et V2	nov. 2027 - déc. 2028	14 mois	Trajectoire BP 2028

Table 3 — Synthèse des phases, durées et jalons de sortie.

Trois recouvrements structurent l'efficacité du calendrier. D'abord, la conception produit (P1) et la conception technique (P2) avancent en parallèle et se nourrissent mutuellement : chaque écran maquetté est arbitré contre ses exigences techniques, ce qui évite l'effet tunnel. Ensuite, la conformité réglementaire (P3) démarre avant même la fin de la conception, car les délais administratifs d'agrément et de signature des conventions d'apport ne se compressent pas : c'est le chemin critique du projet. Enfin, la phase de qualité (P5) recouvre les deux derniers sprints de développement, les tests de régression accompagnant chaque incrément livré. Cette organisation tasse la durée totale à vingt-six mois tout en conservant des responsabilités claires.

4. Phase 0 — Cadrage et financement

La phase 0 transforme l'intention en organisation de projet. Son objectif est double : définir précisément ce qui sera construit en priorité, et sécuriser les moyens de le construire. Elle s'exécute en quatre semaines, de novembre à décembre 2026, par une équipe resserrée de deux à trois personnes — la fondatrice porteuse du projet, le futur directeur technique et un consultant financier ponctuel. Son produit essentiel est un périmètre de MVP réaliste, débarrassé de l'ambition des 120 écrans de l'étude complète, et un financement débloqué.

4 semaines novembre - décembre 2026	**2 à 3** personnes mobilisées	**28 écrans** périmètre MVP priorisé sur 120	**50 M FCFA** financement à boucler (J0)

4.1 Activités clés

Les activités de cadrage s'enchaînent en quatre semaines structurées, chacune produisant un livrable contrôlable :

Activité	Livrable	Responsable	Durée
Atelier de priorisation MoSCoW des 120 écrans	Périmètre MVP (28 écrans, 6 modules)	Fondatrice + CTO	1 semaine
Consolidation des 46 règles métier en spécifications	Backlog produit initial estimé	CTO	1 semaine
Finalisation du dossier de financement (apport, investisseur, subventions tech)	Plan de financement 50 M FCFA	Fondatrice	3 semaines
Recrutement du noyau (développeur back, développeur front, designer)	Lettres d'engagement, planning	Fondatrice + CTO	3 semaines
Mise en place des outils (dépôt Git, gestion de projet, espaces de travail)	Environnement de collaboration	CTO	1 semaine

Table 4 — Activités de la phase 0.

La priorisation suit la méthode MoSCoW appliquée aux six modules de l'étude fonctionnelle. Entrent dans le MVP le comparateur et les devis, la souscription avec paiement Mobile Money et attestation digitale, l'espace contrats avec notifications de renouvellement, la déclaration de sinistre par photo et le back-office d'administration. Sortent du MVP, au profit des phases ultérieures, l'espace Pro et BTP avec les cautions de soumission, l'assurance maritime et import, la diaspora en tant que module dédié et les fonctions sociales avancées. Cette discipline de périmètre est la première protection du calendrier : elle replace les ambitions différenciantes de la plateforme après la preuve de concept commerciale, sans jamais les sacrifier.

4.2 Critères de sortie et jalon J0

La phase 0 est close au jalon J0 lorsque trois conditions sont réunies simultanément. Primo, le plan de financement est bouclé ou sécurisé à au moins 60 % — les fonds couvrant les phases 1 et 2 sont engagés, le solde fait l'objet d'engagements conditionnés aux jalons suivants. Secundo, le périmètre MVP est signé par la fondatrice et le CTO, avec un backlog estimé et un calendrier de huit sprints. Tertio, le noyau de l'équipe de conception est engagé par écrit. À défaut, le démarrage des phases 1 et 2 est différé de quatre semaines maximum, le temps de combler le ou les critères manquants.

5. Phase 1 — Conception produit et UX

Cette phase traduit les 515 pages de conception théorique en interfaces exécutables. Son enjeu n'est pas de redessiner le produit mais de le rendre réaliste : chaque parcours issu des dossiers est éprouvé contre les contraintes réelles du terrain camerounais — téléphones d'entrée de gamme, connexions 3G irrégulières, usagers découvrant l'assurance. La phase mobilise quatre personnes pendant six semaines et produit le design system, les maquettes haute fidélité du parcours MVP et un prototype cliquable testé par de futurs utilisateurs.

5.1 Activités clés

Le travail s'organise en quatre chantiers séquencés, du socle graphique aux tests utilisateurs :

- **Design system Unirances** : tokens graphiques (typographies, palette bleue dérivée de la charte du projet, espacements), bibliothèque de composants réutilisables (champs, cartes produits, boutons de paiement, badges d'état), et règles d'écriture en français simple pour les mentions d'assurance.
- **Maquettes haute fidélité du parcours MVP** : de la recherche de devis à l'attestation digitale en passant par le paiement Mobile Money et l'espace contrats, en reprenant écran par écran les spécifications des dossiers 4 à 6.
- **Harmonisation des parcours divergents** : le parcours de sinistre est figé sur la version en six étapes du dossier final, qui prime sur les variantes antérieures des dossiers séparés — cette décision lève l'une des incohérences relevées lors de l'analyse des documents.
- **Prototype cliquable et tests utilisateurs** : mise en situation de douze profils à Yaoundé et Douala (salariés, commerçants, étudiants, professionnels du BTP) sur téléphones d'entrée de gamme et connexion 3G, mesure des points de friction et itération des écrans critiques.

Les tests utilisateurs portent une attention particulière à deux moments : la compréhension du devis (l'utilisateur doit savoir ce qu'il achète sans appel d'assistance) et la confiance dans l'attestation numérique (le QR code doit inspirer plus de confiance qu'un document papier). Les résultats sont notés dans un rapport de tests qui alimente directement les correctifs de maquettes avant le jalon J1.

5.2 Critères de sortie

La phase 1 se conclut quand l'intégralité du parcours MVP est maquettée en haute fidélité, quand le prototype a été testé par au moins dix utilisateurs sans blocage majeur non résolu, et quand le design system est publié dans un dépôt consultable par les développeurs. La mesure de succès est simple : un développeur doit pouvoir implémenter chaque écran sans poser de question de conception. Ce critère, apparemment exigeant, est celui qui différencie un dossier de conception d'un produit délivrable.

6. Phase 2 — Conception technique et architecture

L'analyse des dossiers de conception avait identifié l'absence de choix techniques comme la principale lacune du projet : la vision fonctionnelle est mature, mais aucune stack, aucune architecture et aucun plan d'intégration n'étaient fixés. La phase 2 comble ce vide en huit semaines, en parallèle de la phase 1, avec une équipe de trois personnes (CTO, développeur back senior, consultant DevOps). Son livrable pivot est le dossier d'architecture technique (DAT), complété par une preuve de concept du paiement Mobile Money réalisée en conditions réelles.

6.1 Stack technique proposée

Les choix suivants privilégient la simplicité opérationnelle, le coût maîtrisé et l'adéquation au contexte mobile camerounais ; ils seront consolidés dans le DAT puis mis en oeuvre dès la phase 4 :

Couche	Choix proposé	Justification
Client	PWA (Progressive Web App) mobile-first	Installable sans store, poids léger adapté aux forfaits data, une seule base de code web et mobile
Front-end	React + TypeScript	Écosystème mature, composants alignés sur le design system, recrutement facile au Cameroun
API et logique métier	API REST — Node.js (NestJS) ou Django	Cadres robustes, validations serveur des 46 règles métier, documentation auto-générée (OpenAPI)
Données	PostgreSQL + stockage objets (S3 compatible)	Intégrité transactionnelle des contrats, stockage chiffré des pièces justificatives et attestations
Hébergement	Cloud avec CDN (région Europe ou Afrique)	Latence maîtrisée depuis Douala et Yaoundé, sauvegardes automatisées, coût de démarrage inférieur à 150 000 FCFA par mois
Livraison	CI/CD (GitHub Actions), environnements dev / staging / prod	Déploiements reproductibles, rollbacks rapides, tests automatisés à chaque commit

Table 5 — Stack technique cible du MVP.

6.2 Sécurité, données et intégrations

La plateforme traite des données personnelles et financières sensibles : le socle de sécurité est conçu dès cette phase, non rattrapé après. Le plan retient les exigences suivantes, détaillées dans le DAT : chiffrement TLS sur tous les échanges et chiffrement au repos des documents, authentification par numéro de téléphone avec code à usage unique, journaux d'audit des actions sensibles, et conformité à la loi camerounaise n° 2010/012 relative à la protection des données personnelles, avec déclaration auprès de la CNDP avant tout traitement en production. Côté intégrations, la preuve de concept porte sur les API de collecte Mobile Money de MTN et d'Orange — point le plus risqué du MVP — ainsi que sur le mécanisme de vérification des attestations par QR code. Les échanges avec les compagnies partenaires s'effectuent en version 1 par échanges de fichiers sécurisés quotidiens, l'interconnexion temps réel étant repoussée à la phase d'industrialisation.

6.3 Critères de sortie et jalon J1

La phase 2 s'achève au jalon J1 lorsque le DAT est validé par le comité de pilotage, que la preuve de concept de paiement a atteint un taux de succès d'au moins 95 % sur une batterie de tests réels, et que les environnements de développement et de staging sont opérationnels avec leur chaîne de livraison continue. C'est également à ce jalon que l'équipe de développement complète (quatre à six personnes) est engagée, sur la base des estimations du backlog affinées par le CTO.

7. Phase 3 — Conformité réglementaire et partenariats

Sans agrément ni conventions d'apport, la plateforme n'encaisse aucune commission : cette phase est le chemin critique du projet et elle est traitée comme telle. Elle démarre dès la septième semaine — avant même la fin de la conception — car les délais administratifs ne se compressent pas, et elle s'étale sur vingt semaines, de janvier à juin 2027. Elle mobilise la fondatrice, un conseil juridique spécialisé en droit des assurances OHADA et CIMA, et un effort commercial permanent auprès des compagnies ciblées.

7.1 Le chemin de l’agrément et des conventions

Unirances opère comme intermédiaire d'assurance (courtier), statut qui exige un capital modeste comparé à celui d'une compagnie mais un dossier de conformité rigoureux. Les étapes suivantes sont engagées séquentiellement dès que possible, avec recouvrement lorsque le règlement le permet :

Étape	Autorité / référence	Durée estimée	Dépendance
Constitution de la société (SARL) et immatriculation	Registre du commerce, OHADA	2 à 3 semaines	Aucune
Dépôt du dossier d’agrément d’intermédiaire (courtier)	ASAC — régime des intermédiaires, Code CIMA art. 506-508	6 à 10 semaines	Société constituée, programme d’activité

Étape	Autorité / référence	Durée estimée	Dépendance
Constitution de la garantie financière	Code CIMA art. 530 — 10 M FCFA	3 à 4 semaines	Personne morale, compte bancaire pro
Assurance de responsabilité civile professionnelle	Compagnie agréée	1 à 2 semaines	Aucune
Conventions d'apport avec 2 à 4 compagnies cibles	SAAR, Activa, SUNU, AREA (cibles des dossiers)	6 à 12 semaines	Dossier d'agrément déposé, démonstrations
Contrat marchand Mobile Money	MTN MoMo / Orange Money	3 à 5 semaines	Société constituée

Table 6 — Feuille de route réglementaire et contractuelle.

L'argumentaire auprès des compagnies est préparé dès la phase 1 et répété pendant toute la phase : Unirances apporte des clients pré-qualifiés à coût d'acquisition inférieur au réseau d'agences physiques, sans prétendre au risque ni aux provisions. Les démonstrations s'appuient sur le prototype cliquable de la phase 1, bien plus convaincant qu'une présentation théorique. La cible est d'obtenir au moins deux conventions signées avant l'ouverture du pilote — le lancement commercial en exigera quatre. La garantie financière de dix millions de FCFA est constituée de préférence par caution bancaire, dont le coût annuel (environ 1,2 à 1,5 million de FCFA) est budgété au chapitre 13 ; le dépôt bloqué reste l'alternative si la banque l'exige.

7.2 Critères de sortie

Cette phase n'a pas de jalon propre mais deux seuils contraignants pour les phases aval. Le pilote (phase 6) ne s'ouvre qu'avec au moins une convention d'apport effective et l'agrément en état d'être délivré ; le lancement commercial (phase 7) exige l'agrément effectif et deux conventions. En cas de dérive de plus de six semaines sur ces seuils, le comité de pilotage déclenche le plan de repli : élargissement du panel de compagnies approchées et resserrement du périmètre du pilote sur les produits déjà couverts par les conventions obtenues.

8. Phase 4 — Développement du MVP

Seize semaines, huit sprints de deux semaines, une équipe de six personnes : c'est le bloc de construction du produit. Chaque sprint livre un incrément démontrable de la plateforme, passé en revue avec deux utilisateurs référents et la fondatrice. Le rythme est volontairement régulier — planification le lundi de sprint impair, revue et rétrospective le vendredi de sprint pair — et la démonstration de fin de sprint est un engagement public de l'équipe, pas une option. La Definition of Done d'une fonctionnalité inclut ses tests unitaires, sa revue de code et sa mise en conformité avec les maquettes validées.

8 sprints sprints de 2 semaines, févr. - juin 2027	**6 personnes** équipe de développement au complet	**28 écrans** périmètre MVP issu de la phase 0	**≥ 70 %** couverture de tests unitaires visée

8.1 Le plan de sprints

L'ordre des sprints suit la logique de risque : d'abord le socle et les intégrations à incertitude élevée (paiement Mobile Money), ensuite la chaîne de valeur commerciale (devis, souscription, attestation), enfin la fidélisation et l'outillage interne :

Sprint	Semaines	Périmètre	Démonstration de fin de sprint
S1	S13-S14	Socle technique : authentification OTP, profils, infrastructure CI/CD, données de référence des produits	Inscription et connexion fonctionnelles en staging
S2-S3	S15-S18	Comparateur et moteur de devis multi-compagnies avec les règles tarifaires des produits Auto et Scolaire	Devis Auto et Scolaire complets sur données réelles
S4-S5	S19-S22	Souscription, paiement Mobile Money (MTN et Orange), génération de l'attestation et du QR code	Souscription de bout en bout avec paiement de test
S6	S23-S24	Espace « Mes contrats », historique des paiements, notifications de renouvellement (push et SMS)	Tableau de bord contrats avec alerte d'échéance
S7	S25-S26	Déclaration de sinistre par photo, pièces justificatives, suivi du statut du dossier	Parcours sinistre en six étapes complet
S8	S27-S28	Back-office : administration des produits, gestion des dossiers, export vers les compagnies, tableau de bord de reporting	Dossier remonté d'un bout à l'autre (front et back-office)

Table 7 — Plan des huit sprints de développement du MVP.

8.2 Pratiques d'ingénierie

Quatre pratiques non négociables encadrent les sprints. La couverture de tests unitaires des modules métier est maintenue à au moins 70 % dès le premier sprint — la rattraper en fin de projet coûte trois fois plus cher. La chaîne CI/CD exécute tests et vérifications à chaque commit, et aucun code n'entre en staging sans revue de code. Les intégrations externes (Mobile Money, échanges assureurs) sont développées contre des simulateurs puis confrontées aux environnements réels dès que les contrats marchands le permettent. Enfin, un registre des décisions techniques consigne chaque arbitrage notable, afin que l'équipe qui rejoindra le projet en phase d'industrialisation comprenne le pourquoi de chaque choix. Les deux derniers sprints recouvrent la phase de qualité décrite au chapitre suivant.

8.3 Critères de sortie

La phase 4 est close lorsque l'ensemble du périmètre MVP est fonctionnel en staging : parcours de devis, souscription, paiement, attestation, contrats, sinistres et back-office. Les critères mesurables sont la couverture de tests unitaires d'au moins 70 % sur les modules métier, l'absence de bug bloquant ou majeur ouvert sur le parcours critique, et la démonstration de bout en bout réalisée devant la fondatrice avec des données réelles anonymisées.

9. Phase 5 — Qualité, sécurité et tests

Quatre semaines de qualification interviennent à cheval sur la fin du développement et préparent le jalon J2. L'objectif n'est pas de chasser le zéro défaut — inaccessible — mais de garantir que les parcours qui portent l'argent et la confiance de l'assuré sont irréprochables : souscrire, payer, recevoir une attestation valide, déclarer un sinistre. La phase mobilise l'ingénieur QA, l'équipe de développement pour les correctifs, et un prestataire externe pour le test d'intrusion.

Type de test	Objectif	Critère de passage
Tests unitaires et d’intégration	Valider les 46 règles métier et les connecteurs (MoMo, échanges assureurs)	Couverture ≥ 70 %, 100 % des cas de test d’intégration au vert
Tests de bout en bout	Parcourir les scénarios critiques réels de bout en bout	100 % des scénarios critiques passés sur staging
Tests de performance	Supporter les pics d’usage sur réseau dégradé	Temps de réponse < 3 s en 3G simulée, 100 utilisateurs simultanés sans erreur
Test d’intrusion externe	Détecter les failles applicatives et d’infrastructure	Aucune vulnérabilité critique ou haute non corrigée
Recette métier (UAT)	Faire valider les parcours par la courtière responsable et un panel interne	Validation formelle signée des six modules

Table 8 — Plan de qualification du MVP.

La sécurité fait l'objet d'une attention singulière parce que la plateforme détient des pièces d'identité, des données de paiement et des attestations opposables. Outre le test d'intrusion, la revue de sécurité vérifie le chiffrement au repos des documents, la politique de conservation des données, la conformité de la déclaration CNDP et la procédure de gestion d'incident, qui doit être écrite et testée avant l'ouverture au public. Les correctifs issus des tests sont priorisés par sévérité et les vulnérabilités critiques sont traitées sous quarante-huit heures.

9.1 Critères de sortie et jalon J2

Le jalon J2 ouvre le pilote lorsque tous les critères de passage de la table 8 sont remplis, qu'au moins une convention d'apport est effective et que le processus de support client (numéro WhatsApp, procédure de traitement des réclamations) est opérationnel. Un seul critère manquant suffit à repousser le pilote d'un cycle de deux semaines — le calendrier global conserve cette marge.

10. Phase 6 — Pilote terrain et itérations

Le pilote met le produit dans les mains de ses futurs clients avant l'engagement marketing : une bêta privée de 200 à 500 utilisateurs recrutés dans le réseau de la fondatrice, sur les campus, dans les PME du BTP et dans les associations de la diaspora, à Yaoundé et Douala. Deux familles de produits seulement — Auto et Scolaire — auprès d'une à deux compagnies partenaires : le pilote cherche la vérité du terrain, pas le volume. Six semaines, des itérations hebdomadaires, et des indicateurs qui décident du lancement.

≥ 8 %	≥ 95 %	NPS ≥ 40	≤ 48 h
conversion devis → souscription (cible pilote)	paiements Mobile Money aboutis	satisfaction nette des bêta-testeurs	délai de correction des bugs majeurs

10.1 Déroulement du pilote

Les bêta-testeurs sont accompagnés par un canal WhatsApp dédié et leur parcours est instrumenté : chaque étape du tunnel devis-souscription-paiement est mesurée pour localiser précisément les abandons. Chaque semaine, l'équipe priorise les correctifs et ajustements d'usage, livre une itération, et publie un point de situation aux indicateurs. En parallèle, la phase prépare le lancement : production des contenus pédagogiques « Assurance Facile » (vidéos courtes sur les droits des assurés), calendrier de communication, script du support client et procédures d'escalade vers les compagnies en cas de sinistre sensible. Les retours qualitatifs sont codifiés dans un registre unique qui alimentera la roadmap V2 décrite au chapitre 12.

10.2 Critères de sortie

Le pilote est concluant lorsque les quatre indicateurs ci-dessus sont atteints sur les deux dernières semaines glissantes du pilote — et non sur la moyenne globale, pour confirmer la tendance — ainsi que la stabilité technique (aucune panne de plus d'une heure sur les quinze derniers jours). À défaut, le pilote est prolongé de deux semaines avec un plan d'action ciblé ; deux prolongations successives déclenchent une revue stratégique du comité de pilotage sur le produit lui-même.

11. Phase 7 — Lancement commercial

Le lancement ouvre la plateforme au grand public au troisième trimestre 2027, en cohérence directe avec le business plan : le chiffre d'affaires de 20 millions de FCFA de la première année est celui d'un exercice de lancement partiel, l'année 2028 portant la charge de la trajectoire à 86,5 millions. Huit semaines pour installer les mécaniques d'acquisition, de support et de pilotage commercial qui feront la différence entre un lancement événementiel et une activité durable.

11.1 Plan d’acquisition

Le mix d'acquisition privilégie les canaux à coût maîtrisé, dans la droite ligne de l'hypothèse du business plan selon laquelle la pédagogie est le premier moteur de la pénétration de l'assurance :

- **Lancement événementiel et presse** : événement de lancement à Douala et Yaoundé, relations presse économique locale, démonstration publique du parcours d'achat et de l'attestation vérifiable par QR code.
- **Acquisition organique** : la série pédagogique « Assurance Facile » diffusée sur WhatsApp et les réseaux sociaux, optimisation pour les recherches locales, parrainage entre assurés.
- **Acquisition payante maîtrisée** : campagnes sociales ciblées plafonnées à un coût par lead de 1 500 FCFA, suspendues dès que le seuil est dépassé, avec réinvestissement sur les canaux les plus convertissants.
- **Canal diaspora** : le parrainage des proches depuis l'étranger, circuit d'acquisition à coût quasi nul identifié dans les dossiers de conception.
- **Support client** : WhatsApp et téléphone aux heures de bureau, objectif de première réponse inférieure à trente minutes, base de connaissances évolutive.

11.2 Pilotage commercial et critères de sortie

Le pilotage hebdomadaire repose sur un tableau de bord unique : polices actives, commissions facturées aux compagnies, taux de renouvellement des échéances, coût d'acquisition et réclamations clients. Les cibles à trois mois du lancement sont de 500 polices actives, un chiffre d'affaires de commissions cumulé d'au moins 4 millions de FCFA, deux nouvelles conventions d'apport signées et un coût d'acquisition par client inférieur à 2 000 FCFA. La phase 7 se clôt lorsque ces cibles sont atteintes ou lorsque leur trajectoire confirme l'atteinte à M+4 ; le projet bascule alors en régime d'industrialisation décrit au chapitre suivant, avec une revue trimestrielle systématique de l'écart au business plan.

12. Phase 8 — Industrialisation et évolutions

La phase 8, la plus longue du plan (quatorze mois, de novembre 2027 à décembre 2028), transforme un produit lancé en plateforme qui scale. Elle mène de front trois chantiers : la consolidation opérationnelle (disponibilité, support, qualité de service), l'enrichissement produit selon la roadmap V2, et la préparation de l'expansion régionale au sein de la zone CIMA, où le cadre réglementaire commun quatorze États rend le modèle directement réplicable.

12.1 La roadmap produit V2

Les évolutions sont priorisées sur la base du registre des retours du pilote et du lancement, puis arbitrées en comité produit mensuel :

- **Interconnexion temps réel avec les compagnies** : passage des échanges de fichiers quotidiens à des API intégrées, réduisant les délais d'émission des attestations et de remontée des sinistres.
- **Espace Pro et BTP complet** : cautions de soumission pour les marchés publics et assurances maritimes et import — les segments à forte valeur ajoutée identifiés dans l'étude fonctionnelle, porteurs de commissions moyennes supérieures.
- **Assistant intelligent de devis** : pré-remplissage assisté, lecture des documents (carte grise, attestation précédente) et recommandation de garanties, pour réduire encore le temps de souscription.
- **Application native** : envisagée seulement si les données d'usage démontrent un plafond de la PWA (rétention, notifications), afin de ne pas dilater la dette de maintenance avant l'heure.
- **Préparation multi-pays** : étude de marché Gabon et Congo, cartographie des compagnies partenaires régionales et conception d'une architecture multi-pays (référentiels produits et tarifs par marché).

12.2 Jalons 2028 et critères de sortie

L'année 2028 est jalonnée de quatre revues trimestrielles : au premier trimestre, l'interconnexion temps réel avec au moins deux compagnies et l'ouverture de l'espace Pro et BTP ; au deuxième, dix mille polices cumulées et la bêta de l'assistant de devis ; au troisième, la conclusion de l'étude multi-pays avec un plan d'entrée chiffré pour un premier marché ; au quatrième, la revue annuelle de l'écart au business plan, dont la cible centrale est un chiffre d'affaires de l'ordre de 86,5 millions de FCFA et un résultat net positif confirmé. La disponibilité de la plateforme est pilotée sur un objectif de service de 99,5 %, avec 20 % de la capacité de développement systématiquement allouée à la dette technique et à la fiabilité.

13. Équipe, gouvernance, budget et risques

Ce dernier chapitre rassemble les moyens transverses du plan : qui fait quoi et quand, avec quel argent, sous quelle gouvernance, et contre quels risques. Il est le chapitre de référence du comité de pilotage, qui s'y reportera à chaque jalon pour vérifier que les moyens annoncés restent alignés sur les besoins réels du projet.

13.1 Équipe et effectifs

L'équipe cœur croît par paliers calés sur les phases : deux personnes au cadrage, quatre à six en conception, six en développement, huit à dix au pilote et au lancement, puis douze en régime d'industrialisation. Certains rôles sont externalisés au démarrage — conseil juridique, design en mi-temps, DevOps — puis internalisés lorsque la charge le justifie :

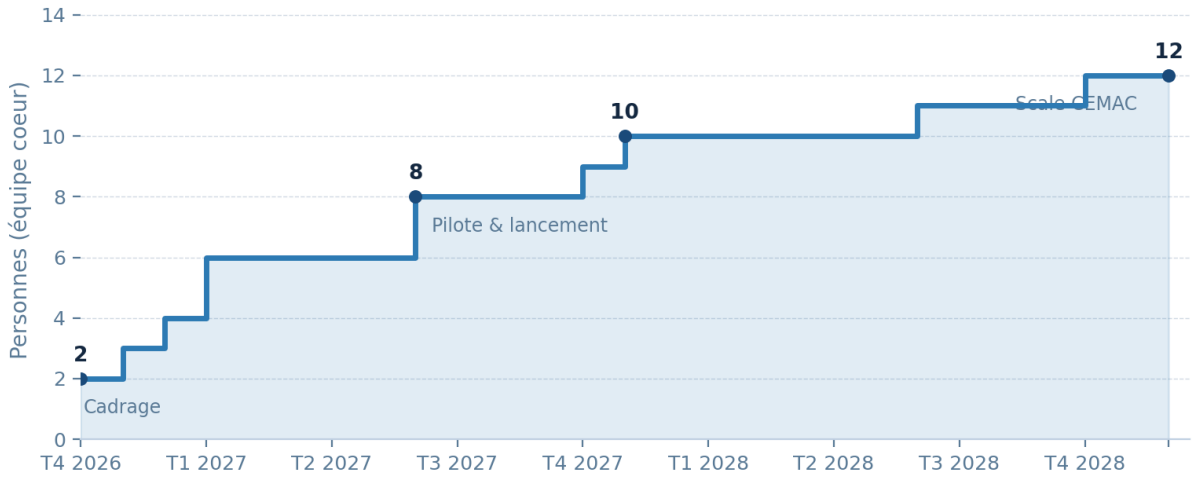


Figure 2 — Effectifs de l'équipe cœur sur la durée du plan.

Rôle	Arrivée	Mission principale
Fondatrice — courtière responsable	S1	Vision produit, relations compagnies, conformité, lancement
Directeur technique (CTO)	S1	Architecture, équipe de développement, choix techniques
Développeur back-end	S5	API, règles métier, intégrations MoMo et assureurs
Développeur front-end / PWA	S5	Interfaces, design system, performance mobile
Designer UX/UI (mi-temps)	S5	Maquettes, tests utilisateurs, évolutions d'usage
Conseil juridique et conformité (externe)	S7	Dossier d'agrément, conventions, contrats, CNDP
Ingénieur QA	S20	Plan de tests, automatisation, recette métier
Responsable croissance et communication	S30	Acquisition, contenus pédagogiques, support client

Rôle	Arrivée	Mission principale
Support client (2 postes)	S35	WhatsApp et téléphone, traitement des réclamations
DevOps / data (mi-temps)	T1 2028	Fiabilité, supervision, reporting décisionnel

Table 9 — Plan de recrutement et missions par rôle.

13.2 Budget de développement

Le budget total de 50 millions de FCFA, identifié par le business plan comme besoin de financement initial, est réparti en six postes dont une réserve de 12 % — proportion minimale recommandée pour un projet à intégrations externes. La garantie financière prévue par l'article 530 du Code CIMA est constituée par caution bancaire, dont le coût annuel est porté par le poste conformité ; le dépôt bloqué de dix millions resterait une alternative financée hors de ce budget opérationnel :

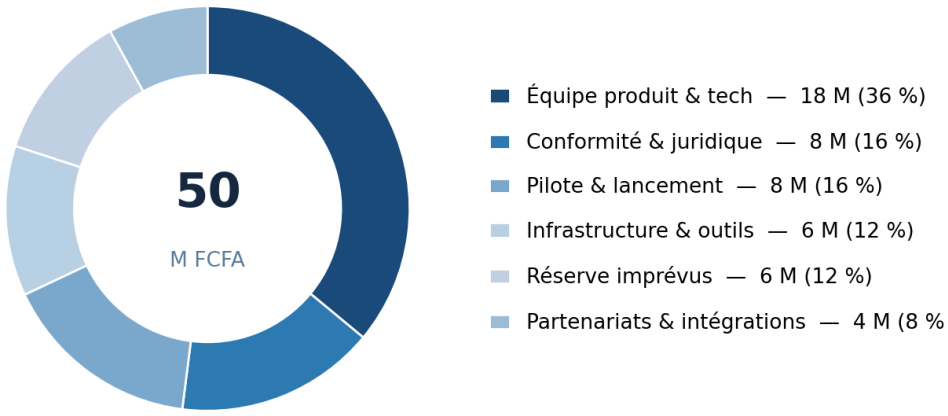


Figure 3 — Répartition du budget de développement de 50 millions de FCFA.

Poste budgétaire	Montant	Contenu principal
Équipe produit et tech	18 M FCFA	Salaires et charges de l'équipe de développement sur la période de construction (phases 1 à 5)
Conformité et juridique	8 M FCFA	Constitution, dossier d'agrément, caution de la garantie financière, RC professionnelle, conseil CNDP
Pilote et lancement commercial	8 M FCFA	Bêta, événement de lancement, communication, acquisition payante du premier trimestre
Infrastructure et outils	6 M FCFA	Hébergement cloud, CI/CD, licences, SMS et notifications (26 mois)
Réserve pour imprévus	6 M FCFA	12 % du budget — déclenchée sur décision du comité de pilotage

Poste budgétaire	Montant	Contenu principal
Partenariats et intégrations	4 M FCFA	Frais de tests MoMo, outillage des échanges assureurs, déplacements et démonstrations

Table 10 — Détail du budget de développement (total : 50 M FCFA).

13.3 Gouvernance de pilotage

Le projet est piloté par un comité de pilotage mensuel — fondatrice, CTO, et à partir de J1 le responsable financier — qui examine l'avancement des phases, la consommation budgétaire et le registre des risques. Les quatre jalons GO/NO-GO font l'objet de comités dédiés avec décision formelle consignée. Le suivi financier est rapproché trimestriellement des hypothèses du business plan, tout écart supérieur à 15 % déclenchant une revue de trajectoire. Enfin, le reporting opérationnel repose sur le tableau de bord produit (indicateurs d'usage et commerciaux) et le tableau de bord technique (disponibilité, incidents, dette technique), tous deux accessibles au comité en continu.

13.4 Registre des risques et mesures d’atténuation

Six risques majeurs sont identifiés, évalués en probabilité et en impact, et accompagnés chacun d'une mesure d'atténuation active. Ce registre est revu à chaque comité de pilotage :

Risque	Probabilité	Impact	Mesure d’atténuation
Retard de l’agrément ASAC	Élevée	Critique	Démarrage anticipé à S7, dossier complet dès le premier dépôt, conseil spécialisé, suivi hebdomadaire
Conventions d’apport non signées à temps	Moyenne	Critique	Panel de 4 compagnies approchées (cible 2), argumentaire coût d’acquisition, démonstrations précoces
Instabilité des paiements Mobile Money	Moyenne	Élevé	POC dès la phase 2, double intégration MTN et Orange, procédure de rejeu et support dédié
Financement incomplet	Moyenne	Critique	Séquençage par jalons, engagement conditionnel des fonds, recherche complémentaire (subventions tech africaines)
Incident de sécurité ou fuite de données	Faible	Critique	Test d’intrusion externe, chiffrement systématique, conformité CNDP, plan de réponse testé
Adoption plus lente que prévu	Moyenne	Élevé	Pilote avant tout engagement lourd, contenu pédagogique, ajustement du mix d’acquisition au coût par lead

Table 11 — Registre des risques du plan d’exécution.

La force de ce plan tient moins dans chaque disposition prise isolément que dans leur cohérence d'ensemble : un périmètre MVP tenu, un chemin réglementaire démarré avant d'être bloquant, des jalons qui protègent le financement, et une équipe qui croît au rythme des preuves apportées. C'est cette discipline qui donne à Unirances sa probabilité de tenir la trajectoire 2027-2029 fixée par le business plan, et la capacité de devenir, au-delà du Cameroun, la plateforme de référence de la distribution d'assurance digitale dans l'espace CIMA.
